



Hội thảo Kế hoạch thí điểm QTRR toàn trình tại Trung tâm Vận hành khai thác

PHÒNG QUẢN TRỊ RỦI RO – TRUNG TÂM VẬN HÀNH KHAI THÁC

THÁNG 8/2026

Nội dung

- 01 | Tổng quan dự án ERM
- 02 | Lí do lựa chọn thí điểm tại Trung tâm VHKT
- 03 | Kế hoạch triển khai chi tiết tại Trung tâm VHKT
- 04 | Cơ chế phối hợp & kết quả cần đạt





1.

Tổng quan dự án QTRR Doanh nghiệp (ERM)

Dự án QTRR doanh nghiệp (ERM)

ERM là gì?

“

ERM được định nghĩa là: tổng thể văn hóa, năng lực và thông lệ quản lý rủi ro, được tích hợp vào chiến lược và hoạt động của tổ chức, nhằm tạo dựng, bảo toàn và hiện thực hóa giá trị.

Việc thực hiện ERM giúp tổ chức nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro một cách có hệ thống — thay vì xử lý từng sự cố riêng lẻ sau khi đã xảy ra.

Theo COSO ERM 2017

Cảnh báo rủi ro sớm

Phát hiện, phòng ngừa rủi ro trước khi thành tổn thất thực tế

Hỗ trợ ra quyết định

Cung cấp bức tranh toàn cảnh về QTRR và hỗ trợ công tác ra quyết định chiến lược

Tối ưu nguồn lực

Phân bổ nguồn lực vào các rủi ro trọng yếu, ưu tiên cao

Ngôn ngữ rủi ro chung

Bộ KRI, thước đo, thư viện rủi ro thống nhất toàn tổ chức

01 - TỔNG QUAN

Dự án QTRR doanh nghiệp (ERM)

Đánh giá hiện trạng QTRR dựa trên COSO ERM 2017

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

Chú giải ký hiệu



Đáp ứng



Đáp ứng một phần



Chưa đáp ứng



Quản trị & Văn hóa

●	1. QTRR được lãnh đạo giám sát
●	2. Cơ cấu tổ chức bộ máy QTRR được thiết lập
◐	3. Văn hóa QTRR được xác định
●	4. Thể hiện cam kết với các giá trị cốt lõi
◐	5. Thu hút, phát triển và giữ chân nhân sự



Chiến lược & Thiết lập mục tiêu

●	6. Phân tích bối cảnh kinh doanh
●	7. Xác định khẩu vị rủi ro
●	8. Đánh giá các phương án chiến lược
◐	9. Xây dựng mục tiêu kinh doanh



Thực thi

◐	10. Nhận diện rủi ro
●	11. Đánh giá mức độ trọng yếu của rủi ro
●	12. Đánh giá mức độ ưu tiên của rủi ro
◐	13. Triển khai kế hoạch hành động xử lý rủi ro
◐	14. Xây dựng hồ sơ rủi ro toàn tổ chức



Rà soát & Điều chỉnh

◐	15. Đánh giá thay đổi trọng yếu
◐	16. Rà soát rủi ro và hiệu quả triển khai
◐	17. Cải tiến liên tục công tác QTRR



Thông tin, Truyền thông & Báo cáo

◐	18. Khai thác thông tin và công nghệ
◐	19. Truyền thông thông tin rủi ro
◐	20. Báo cáo về rủi ro, văn hóa và hiệu quả hoạt động

Dự án QTRR doanh nghiệp (ERM)

Đánh giá hiện trạng QTRR dựa trên COSO ERM 2017 (tiếp theo)

✓ NỀN TẢNG ĐÃ CÓ

- ✓ **Bộ máy 3 tuyến** theo IIA đã thiết lập; vai trò lãnh đạo trong QTRR rõ ràng, có luồng báo cáo rủi ro lên BGĐ.
- ✓ **Rủi ro đã gắn vào hoạch định chiến lược chung**: phân tích bối cảnh và đánh giá kịch bản rủi ro khi xác định chiến lược.
- ✓ Đã có quy trình **yêu cầu Tuyến 1 tự đánh giá rủi ro** và quy định **biện pháp ứng phó** rủi ro.
- ✓ Có cơ chế **phối hợp thông tin, đào tạo QTRR định kỳ**; đã có BCP/DRP và **báo cáo** cho BGĐ.

✗ VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT


- ✗ Chưa có Khẩu vị rủi ro (KVRR) và thước đo cấp doanh nghiệp — nền tảng của toàn bộ khung ERM.
- ✗ Chưa có thư viện rủi ro, danh mục rủi ro trọng yếu và phương pháp đánh giá rủi ro cấp doanh nghiệp.
- ✗ Chưa có KRI nên thiếu cảnh báo sớm — chỉ phát hiện rủi ro sau khi đã thành sự cố.
- ✗ Dữ liệu rủi ro phân tán, công cụ báo cáo thủ công; chưa có dashboard QTRR tổng hợp.
- ✗ Văn hóa rủi ro mới ở văn bản, nhận thức chưa đồng đều; chưa đánh giá hiệu quả & mức độ trưởng thành.

Bộ máy quản trị đã có, nhưng thiếu công cụ vận hành (KVRR, KRI, dữ liệu tổn thất, dashboard) → thông tin rủi ro chưa đến được lãnh đạo đúng lúc và đủ chiều sâu.

Dự án QTRR doanh nghiệp (ERM)

Tổng quan dự án ERM cấp TCT

Dự án ERM đã được TGD phê duyệt triển khai theo **Kế hoạch số 290/KH-VDS-VHKT** ngày 17/08/2026, gồm 3 giai đoạn sau:

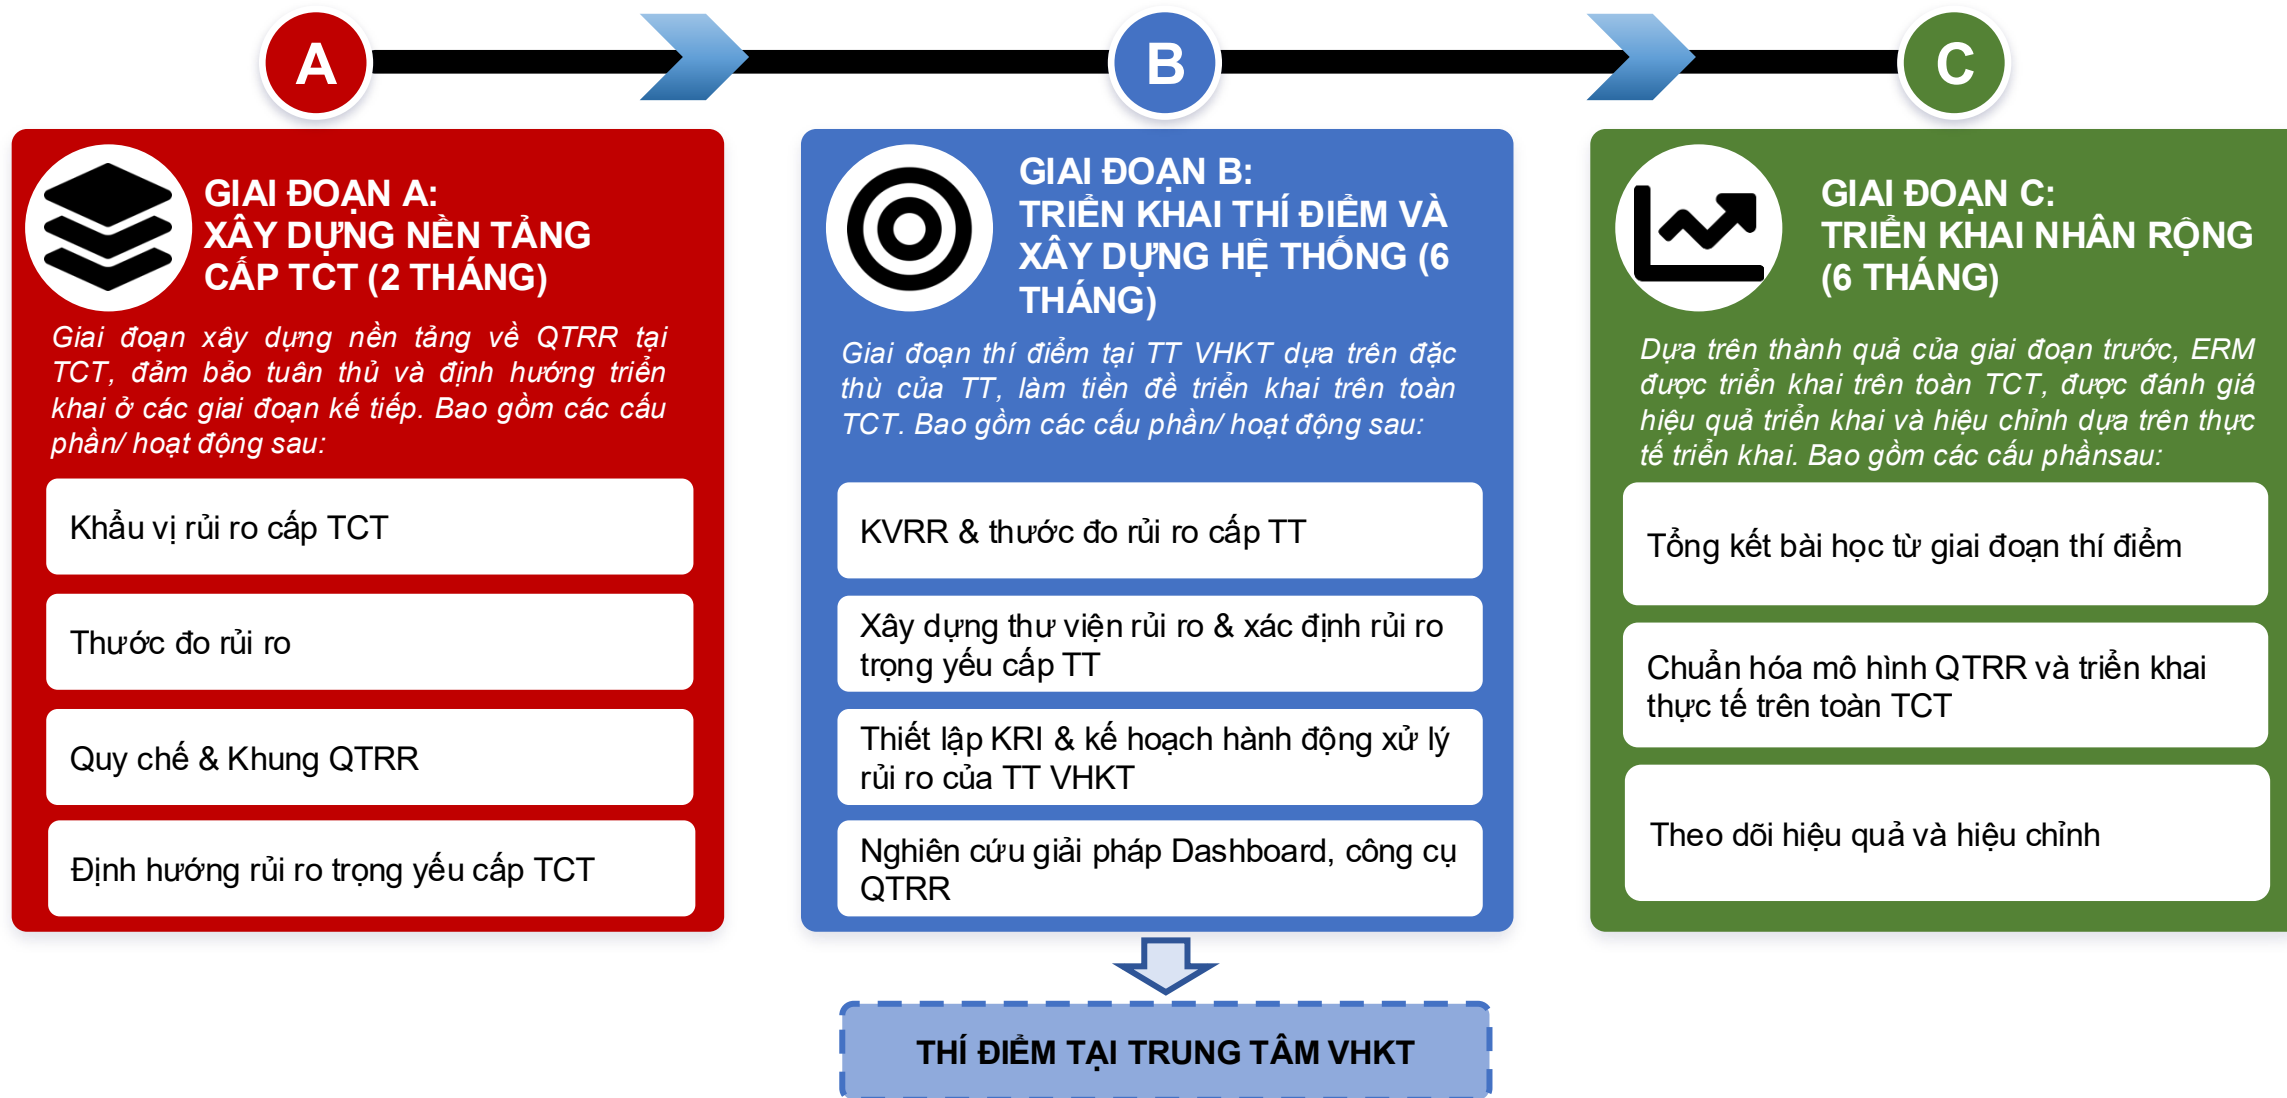



2.

**Lí do lựa chọn thí điểm tại
Trung tâm Vận hành khai thác**

THÍ ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM VHKT

Lí do lựa chọn và mục tiêu sau giai đoạn thí điểm

Trung tâm Vận hành Khai thác quản trị vận hành toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm CNTT của Tổng công ty — nơi phần lớn rủi ro vận hành hàng ngày phát sinh, phù hợp để thí điểm và đánh giá, kiểm chứng hiệu quả thực tế. 04 mảng chức năng tham gia dự án bao gồm:



Phòng QTRR

Chủ trì dự án, xây dựng phương pháp & điều phối



Phòng Đối soát

Đối soát tài chính, đảm bảo dòng tiền & doanh thu



Phòng Khai thác dịch vụ

Vận hành hạ tầng, ứng dụng, database



Phòng Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại

GIÁ TRỊ VỚI VDS

- **Kiểm chứng phương pháp & công cụ trên thực tế** trước khi nhân rộng toàn TCT.
- Tạo bộ mẫu **chuẩn hóa** (thư viện rủi ro, KRI, dashboard) dùng lại cho các đơn vị khác.
- Tạo cơ sở thực tiễn hoàn thiện mô hình ERM, **giảm rủi ro khi triển khai diện rộng**.
- **Kết quả cụ thể**, nhìn thấy được làm căn cứ để lãnh đạo quyết định mở rộng.

GIÁ TRỊ VỚI TRUNG TÂM VHKT

- **Nâng cao mức độ hiệu quả** của công tác QTRR tại Trung tâm.
- **Chủ động nhận diện & cảnh báo sớm** rủi ro vận hành trước khi thành sự cố.
- Có **công cụ/dashboard** theo dõi rủi ro & **sự cố** phục vụ điều hành Trung tâm.
- **Chuẩn hóa** quy trình, dữ liệu; nâng cao năng lực & nhận thức QTRR của các phòng tại Trung tâm



3.

**Kế hoạch triển khai chi tiết tại
Trung tâm Vận hành khai thác**

THÍ ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM VHKT

Tổng quan kế hoạch triển khai giai đoạn thí điểm

1

Khởi động dự án và đánh giá hiện trạng QTRR tại Trung tâm VHKT

Thống nhất triển khai, phân công đầu mối; thu thập dữ liệu phục vụ công tác đánh giá hiện trạng

01 tháng

2

Xây dựng KVRR, thư viện rủi ro và danh mục rủi ro trọng yếu cấp Trung tâm

Cụ thể hóa KVRR; xây thư viện rủi ro; chốt danh mục rủi ro trọng yếu & Risk Owner

01 tháng

3

Xây dựng KRI và kế hoạch hành động xử lý rủi ro trọng yếu cấp Trung tâm

Xây bộ KRI theo ngưỡng cảnh báo; lập KHHĐ (RACI); cơ chế ghi nhận sự cố/tổn thất

02 tháng

4

Xây dựng công cụ/dashboard và triển khai KRI, KHHĐ xử lý rủi ro đã xây dựng

Xây BRD, công cụ/dashboard; nạp dữ liệu, chạy thử KRI & KHHĐ; báo cáo định kỳ

05 tháng

LƯU Ý: CÁC ĐẦU VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN SONG SONG TRONG 06 THÁNG THÍ ĐIỂM

[illegible]

03 – KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT GIAI ĐOẠN THÍ ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM VHKT

Kế hoạch chi tiết

STT	CÔNG VIỆC/ HÀNH ĐỘNG	CHI TIẾT CÔNG VIỆC	ĐẦU VÀO	ĐẦU RA	CHỦ TRÌ	PHỐI HỢP	THỜI GIAN
I - Khởi động dự án và đánh giá hiện trạng QTRR tại Trung tâm Vận hành khai thác (1 tháng)							
1	Thống nhất phương án triển khai & phân công đầu mối	- Tổ chức buổi làm việc khởi động với Ban GD Trung tâm và 4 phòng. - Thống nhất mục tiêu, phạm vi, cách phối hợp; mỗi phòng cử 01 đầu mối chính + 01 dự phòng	Kế hoạch triển khai khung ERM được phê duyệt	Biên bản/Kết luận họp thống nhất cách thức triển khai & danh sách đầu mối các phòng ban tại Trung tâm	P.QTRR	- Ban Giám đốc Trung tâm - Các phòng ban trong Trung tâm	1 tuần
2	Thu thập dữ liệu & khảo sát hiện trạng	- Thu thập data để đánh giá hiện trạng, bao gồm: quy trình nghiệp vụ trọng yếu, dữ liệu sự cố/tồn thất, khiếu nại, lỗi đối soát (khoảng 12 tháng trở lại). - Khảo sát nhận thức QTRR của CBNV các phòng.	- Báo cáo tổng hợp sự cố/khiếu nại/lỗi đối soát - Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của các mảng nghiệp vụ - Bảng khảo sát nhận thức/đánh giá chủ quan của các phòng ban về QTRR	- Bộ dữ liệu hiện trạng về hoạt động tại Trung tâm - Kết quả khảo sát các phòng ban trong Trung tâm	P.QTRR	Các phòng ban trong Trung tâm	1 tuần
3	Phân tích & lập báo cáo đánh giá hiện trạng	- Phân tích khoảng trống theo các khía cạnh - Xác định các điểm rủi ro nổi bật, điểm yếu về kiểm soát và quản trị cho Trung tâm	Dữ liệu hiện trạng, kết quả khảo sát (mục 2)	Báo cáo đánh giá hiện trạng QTRR tại TT VHKT	P.QTRR	- Ban Giám đốc Trung tâm - Các phòng ban trong Trung tâm	2 tuần

03 – KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT GIAI ĐOẠN THÍ ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM VHKT

Kế hoạch chi tiết (tiếp theo)

STT	CÔNG VIỆC/ HÀNH ĐỘNG	CHI TIẾT CÔNG VIỆC	ĐẦU VÀO	ĐẦU RA	CHỦ TRÌ	PHỐI HỢP	THỜI GIAN
II - Xây dựng KVRR, thư viện rủi ro và danh mục rủi ro trọng yếu cấp Trung tâm (1 tháng)							
4	Cụ thể hóa khẩu vị rủi ro (KVRR) cấp Trung tâm	Từ KVRR & thước đo cấp TCT, cụ thể hóa mức chấp nhận rủi ro theo đặc thù vận hành của Trung tâm.	KVRR & thước đo rủi ro cấp TCT (Giai đoạn 1); mục tiêu/KPI vận hành TT	KVRR cấp Trung tâm (1 nhánh của khung TCT)	P.QTRR	Ban Giám đốc Trung tâm	1 tuần
5	Xây dựng thư viện rủi ro cấp Trung tâm	- Tổ chức khảo sát nhận diện rủi ro theo từng mảng: đối soát, khai thác dịch vụ, CSKH, QTRR <i>Lưu ý: Sẽ phát sinh các rủi ro liên phòng ban trong và ngoài Trung tâm</i>	Phân loại rủi ro chung của TCT Dữ liệu đánh giá hiện trạng ở mục 2	Thư viện rủi ro cấp Trung tâm	P.QTRR	- Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có rủi ro liên quan	1.5 tuần
6	Xác định top risk tại Trung tâm và Risk owner	- Xác định phương thức đánh giá và lựa chọn top risk; áp thước đo để chấm điểm rủi ro - Xác định risk owner cho các rủi ro trọng yếu	- Thư viện rủi ro ở mục 5 - Thước đo rủi ro cấp TCT đã xác định ở Giai đoạn 1	Danh mục rủi ro trọng yếu cần theo dõi cấp trung tâm và risk owner tương ứng	P.QTRR	- Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có rủi ro liên quan	1.5 tuần

03 – KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT GIAI ĐOẠN THÍ ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM VHKT

Kế hoạch chi tiết (tiếp theo)

STT	CÔNG VIỆC/ HÀNH ĐỘNG	CHI TIẾT CÔNG VIỆC	ĐẦU VÀO	ĐẦU RA	CHỦ TRÌ	PHỐI HỢP	THỜI GIAN
III - Xây dựng KRI và kế hoạch hành động xử lý rủi ro trọng yếu cấp Trung tâm (2 tháng)							
7	Xây dựng bộ chỉ số cảnh báo rủi ro (KRI)	- Với mỗi rủi ro trọng yếu, xây dựng KRI tương ứng (VD: tỷ lệ lịch đối soát, downtime hệ thống, khiếu nại quá hạn, nghi ngờ gian lận). - Định nghĩa công thức, nguồn dữ liệu, tần suất, ngưỡng Xanh/Vàng/Đỏ.	Danh mục rủi ro trọng yếu (mục 6); nguồn dữ liệu các phòng ban tại Trung tâm	Danh mục KRI kèm công thức, nguồn dữ liệu, ngưỡng cảnh báo	P.QTRR	- Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có rủi ro liên quan	1 tháng
8	Xây dựng kế hoạch hành động xử lý rủi ro (KHHĐ)	Với mỗi rủi ro trọng yếu cần xác định: biện pháp ứng phó, ma trận RACI, thời hạn, nguồn lực, đầu mối theo dõi. => kế hoạch hành động xử lý rủi ro cho Trung tâm	Danh mục rủi ro trọng yếu và risk owner (mục 6)	Bộ KHHĐ xử lý rủi ro cấp Trung tâm	P.QTRR	- Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có rủi ro liên quan	2 tuần
9	Thiết lập cơ chế ghi nhận sự cố/tổn thất	Thống nhất nguyên tắc ghi nhận, theo dõi tập trung sự cố/tổn thất; phân loại, ngưỡng giá trị phải báo cáo; thiết lập biểu mẫu.	Cách ghi nhận sự cố hiện tại (SOC, đối soát, CSKH)	Nguyên tắc, quy trình ghi nhận và xử lý tổn thất (áp dụng thử nghiệm tại TT, điều chỉnh theo thực tế để ban hành cho cấp TCT sau này)	P.QTRR	- Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có rủi ro liên quan	2 tuần

03 – KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT GIAI ĐOẠN THÍ ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM VHKT

Kế hoạch chi tiết (tiếp theo)

STT	CÔNG VIỆC/ HÀNH ĐỘNG	CHI TIẾT CÔNG VIỆC	ĐẦU VÀO	ĐẦU RA	CHỦ TRÌ	PHỐI HỢP	THỜI GIAN
IV - Xây dựng công cụ/dashboard và triển khai KRI, kế hoạch hành động xử lý rủi ro đã xây dựng (5 tháng)							
10	Xây dựng bài toán nghiệp vụ (BRD) & lựa chọn phương án công cụ	Xây BRD số hóa khung QTRR; đánh giá phương án (tự xây / thuê ngoài) theo tiêu chí, trong đó BẮT BUỘC phải có khả năng mở rộng lên cấp TCT.	- Các cấu phần cơ bản đã xây dựng ở GD A dự án - Thư viện rủi ro, danh mục rủi ro trọng yếu, KRI, KHHĐ, luồng ghi nhận và xử lý tổn thất đã xây dựng cho TT - Thông tin về các hệ thống hiện có	- BRD được phê duyệt; - Báo cáo lựa chọn giải pháp hệ thống/công cụ	P.QTRR	- Ban Giám đốc Trung tâm phê duyệt - Team kỹ thuật/công nghệ tham gia đánh giá	1 tháng
11	Xây dựng/tích hợp công cụ, dashboard & chuẩn hóa dữ liệu	Xây/tích hợp công cụ theo dõi KRI & sự cố; chuẩn hóa dữ liệu theo taxonomy cấp TCT; kết nối nguồn dữ liệu (VMS, core hệ thống, CRM,...).	BRD được phê duyệt	Công cụ/dashboard QTRR (first demo)	P.QTRR	Team kỹ thuật/công nghệ tham gia đánh giá	4 tháng

03 – KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT GIAI ĐOẠN THÍ ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM VHKT

Kế hoạch chi tiết (tiếp theo)

STT	CÔNG VIỆC/ HÀNH ĐỘNG	CHI TIẾT CÔNG VIỆC	ĐẦU VÀO	ĐẦU RA	CHỦ TRÌ	PHỐI HỢP	THỜI GIAN
IV - Xây dựng công cụ/dashboard và triển khai KRI, kế hoạch hành động xử lý rủi ro đã xây dựng (5 tháng) (tiếp theo)							
12	Đưa dữ liệu lên hệ thống, thí điểm KRI & KHHD, hiệu chỉnh	Đưa dữ liệu lên hệ thống, thí điểm KRI & KHHD, hiệu chỉnh	- Công cụ/dashboard QTRR (first demo) - KRI đang áp dụng tại TT và dữ liệu liên quan	Báo cáo thử nghiệm & hiệu chỉnh bộ KRI/KHHD	P.QTRR	Team kỹ thuật/công nghệ	2 tháng
13	Vận hành báo cáo định kỳ vào họp giao ban Trung tâm	- Chuẩn hóa mẫu báo cáo rủi ro; đưa nội dung rủi ro (top rủi ro, KRI Vàng/Đỏ, KHHD trễ hạn, sự cố lớn) vào họp giao ban TT. - Đánh giá hiệu quả khi vận hành tại Trung tâm và định hướng nhân rộng lên cấp TCT	Kết quả triển khai QTRR tại TTVHKT	- Báo cáo rủi ro định kỳ; mẫu báo cáo chuẩn hóa - Báo cáo định hướng triển khai các cầu phần cấp TCT	P.QTRR	- Ban Giám đốc Trung tâm - Các phòng ban trong Trung tâm - Team kỹ thuật/công nghệ tham gia đánh giá	2 tháng




4.

Cơ chế phối hợp & kết quả cần đạt

THÍ ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM VHKT

Mô hình tổ chức triển khai dự án tại Trung tâm

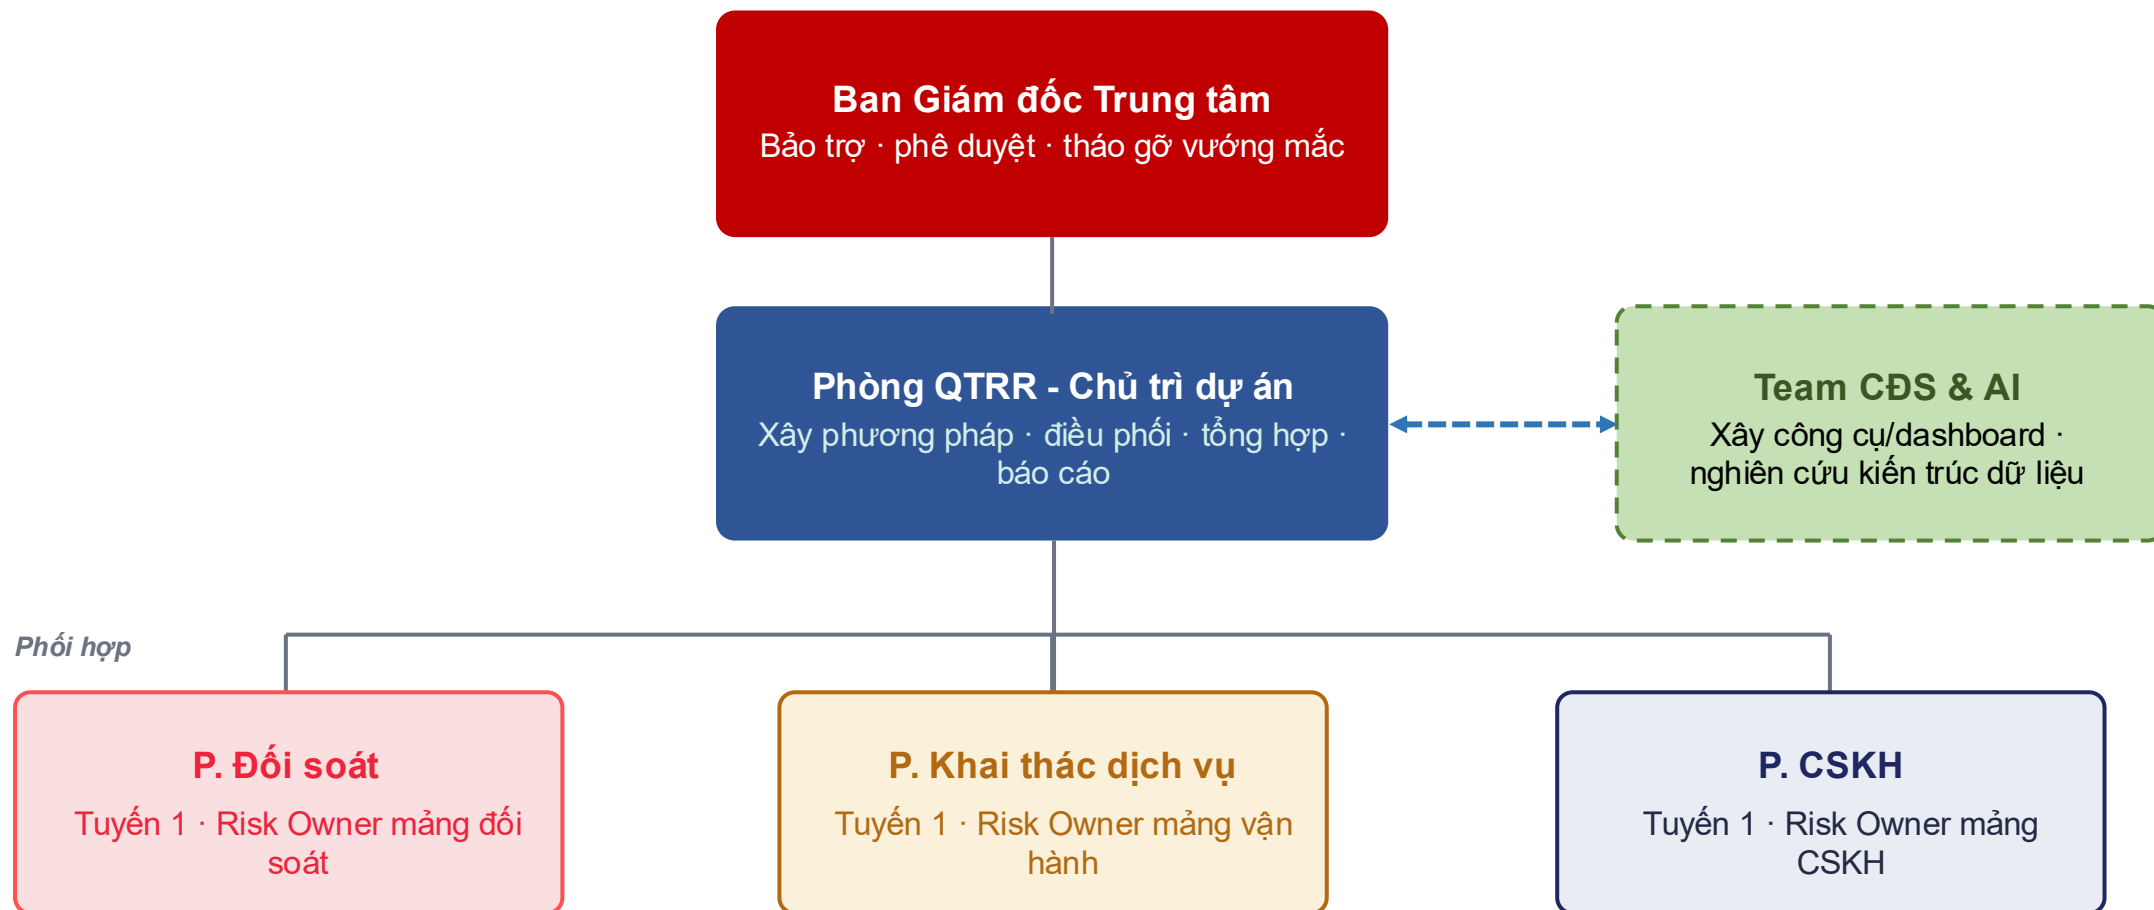

Các đơn vị chủ trì nghiệp vụ (Đối soát, KTDV, CSKH) là Tuyến 1 — trực tiếp sở hữu và xử lý rủi ro mảng mình;
P.QTRR chủ trì, điều phối dự án, nghiên cứu phương pháp xây dựng khung QTRR tại Trung tâm;
Team CDS & AI đảm nhận công cụ, dashboard và tích hợp dữ liệu.

04 – CƠ CHẾ PHỐI HỢP VÀ KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

THÍ ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM VHKT

Ma trận trách nhiệm

Đầu việc	BGD Trung tâm	P.QTRR	P.Đối soát	P.CSKH	P.KTDV	Team CDS & AI
I – Khởi động dự án và đánh giá hiện trạng QTRR tại Trung tâm VHKT	A	R	C	C	C	I
II – Xây dựng KVRN, thư viện rủi ro và danh mục rủi ro trọng yếu cấp Trung tâm	A	R	R	R	R	I
III – Xây dựng KRI và kế hoạch hành động xử lý rủi ro trọng yếu cấp Trung tâm	A	R	R	R	R	C
IV – Xây dựng công cụ/dashboard và triển khai KRI, kế hoạch hành động xử lý rủi ro đã xây dựng	A	R	C	C	C	R

Chú thích:

R Chịu trách nhiệm **A** Phê duyệt **C** Tham vấn **I** Thông tin



Thiết lập mạng lưới điều phối viên

- Mỗi phòng cử 01 đầu mối chính + 01 dự phòng, tham gia xuyên suốt dự án và là cầu nối với P.QTRR.
- Các phòng → điều phối viên → P.QTRR tổng hợp → Ban Giám đốc Trung tâm; báo cáo hai chiều, xác nhận với Risk Owner.



Cách thức trao đổi, phối hợp

- Workshop nhận diện rủi ro theo mảng
- Họp tiến độ định kỳ
- Đưa nội dung rủi ro vào họp giao ban Trung tâm



Nguyên tắc chung

Bám khung nền tảng cấp TCT (KVRR, thước đo, taxonomy); chuẩn hóa dữ liệu; kết quả được Risk Owner xác nhận trước khi ban hành và áp dụng tại Trung tâm

THÍ ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM VHKT

Kết quả cần đạt sau giai đoạn thí điểm

SẢN PHẨM BÀN GIAO

- Báo cáo đánh giá hiện trạng QTRR của Trung tâm
- KVRr cấp Trung tâm; thư viện rủi ro; danh mục rủi ro trọng yếu kèm Risk Owner
- Bộ KRI; kế hoạch hành động (KHHĐ); cơ chế ghi nhận sự cố/tổn thất
- Công cụ/dashboard QTRR chạy thử (kết nối dữ liệu, cảnh báo theo ngưỡng)
- Báo cáo rủi ro định kỳ chuẩn hóa; báo cáo định hướng nhân rộng cấp TCT

HIỆU QUẢ MANG LẠI

- ✓ Nâng cao mức độ hiệu quả của công tác QTRR tại Trung tâm
- ✓ Chủ động cảnh báo sớm rủi ro vận hành trước khi thành sự cố
- ✓ Chuẩn hóa quy trình & dữ liệu rủi ro; sẵn sàng nhân rộng lên cấp TCT
- ✓ Nâng cao nhận thức & năng lực QTRR của các phòng
- ✓ Kết quả cụ thể, đo lường được làm căn cứ để lãnh đạo quyết định mở rộng

viettel

THANK YOU
